

민선6기(제24대) 구청장공약사업 관리카드

관리번호	2-2
-------------	------------

공약제목	안전지역 확대를 위한 영상정보시스템(CCTV) 구축		
주관부서	문화홍보과 (정보통신담당) 담당자 신성욱 ☎663-3902	관련기관 [협조부서]	대구시 재난안전실 안전관리과
사업기간	'14. 7월 ~ '18. 6월	소요예산	2,936백만원(국 754, 시 778, 구 1,404)

【공약내용】

안전지역 확대를 위한 영상정보시스템(CCTV) 구축 통한 안전 서구 구현

【사업개요 및 투자계획】

사업개요

- 사업기간 : 2014. 7월 ~ 2018. 6월
- 위 치 : 생활안전 취약지역(어린이보호구역 및 도시공원 포함)
- 사 업 비 : 2,936백만원(국 754, 시 778, 구 1,404)
- 사업내용
 - 생활안전 영상정보시스템(CCTV) 증설
 - 노후화된 영상정보시스템(CCTV) 교체
 - CCTV통합관제센터 효율적 운영

연차별 추진계획

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
관제센터 구축	1식	1식	-	-	-	-
CCTV 증설(대)	102	35	33	16	18	-
CCTV 교체(대)	63	2	20	20	21	-

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	투 자 계 획								투 자 실 적		
	계	임기전	임 기 내					임기후	계	임기전	2014.7. ~ 2017.12.
			2014	2015	2016	2017	2018				
계	2,936		1,332	712	440	452		3,471		3,471	
국비	754		618	136				1,701		1,701	
시비	778		378	200	100	100		1,306		1,306	
구비	1,404		336	376	340	352		464		464	
민자											

⇒ 임기전 사업비는 2014. 7월 이전 사업비

【 추진 실적 】

구분	계	2014	2015	2016	2017	비고
통합관제센터구축	1식	1식	-	-	-	
CCTV 확충(대)	298	54	56	132	56	
CCTV 교체(대)	64	5	24	35	-	


【추진상황】

이행완료		추진중		미착수	비고
종결	이행후 계속추진	정상(진도율)	부진		
	○				

【향후계획】

- 지속적인 CCTV 구축 사업 추진
 - 국·시비 예산요구 등으로 생활안전 CCTV 설치 사업 확대
- CCTV통합관제센터 안정적 운영
 - 24시간 실시간 관제 및 정기적 시스템 점검 실시

【사진자료】

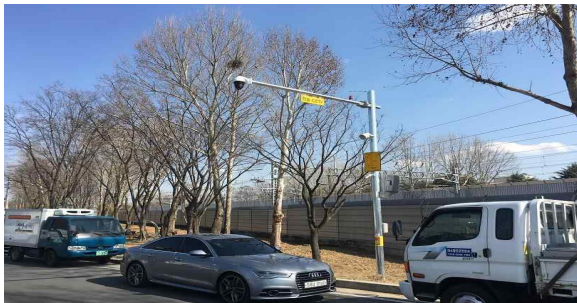

안심 CCTV 설치 (비산7동 철로변)



생활안전 CCTV 설치(삼익공원)
